

COMPLESSO DELLA CERTOSA

Intervento di restauro e consolidamento con rafforzamento locale
 R.E.R.n°2757

Dott. Aldo Modonesi Assessore OO.PP. e Beni Monumentali
 Ing. Luca Capozzi Dirigente di Settore OO.PP. e RUP in fase di progettazione
 arch. Natascia Frasson Dirigente del Servizio Beni Monumentali e RUP in fase di esecuzione
 Ing. Giada Guzzinati assistente al RUP
 arch. Ambrogio Keoma Alta sorveglianza Soprintendenza Fe

arch. Pietro Pigozzi progetto architettonico
 Ing. Davide Codeca progetto strutturale
 Ing. Andrea Bernagozzi impianti
 arch. Maria di Donato coordinamento sicurezza

FONDI DI FINANZIAMENTO: Importo complessivo progetto € 1.305.937,76 di cui Euro 988.498,76 fondi RER e Euro- 946.695,00 Fondi assicurativi comunali.
 RUI RESOZZI Cesare, GEO Costruzioni, EDILARVA, BARUFFALDI Roberta, CESA
 Direttore di Cantiere: Falcini arch. Nicola

staf studio tecnico associato ferrara
 arch. piccio pigozzi
 44122 Ferrara - Via L. Galimelli, 11 - Tel. 0532.55111

ING. DAVIDE CODECA
 STUDIO DI INGEGNERIA

GEO COSTRUZIONI
 conservazione beni culturali

EDILAR.VA.
 INTERVENTI CONSERVATIVI

BARUFFALDI ROBERTA
 Restauri opere d'arte

C.E.S.A.
 conservazione beni culturali

SUPERFICI IN COTTO



stato di fatto del capitello mancante



montaggio del capitello riconsuito
 previa realizzazione di calco utilizzando come matrice il capitello adiacente intatto

stato di fatto del capitello di destra dove la scelta è stata altamente conservativa consolidare il pezzo originale ed integrare geometricamente le parti mancanti



fase intermedia dove sono rileggibili le stuccature ancora da completare

intervento completato

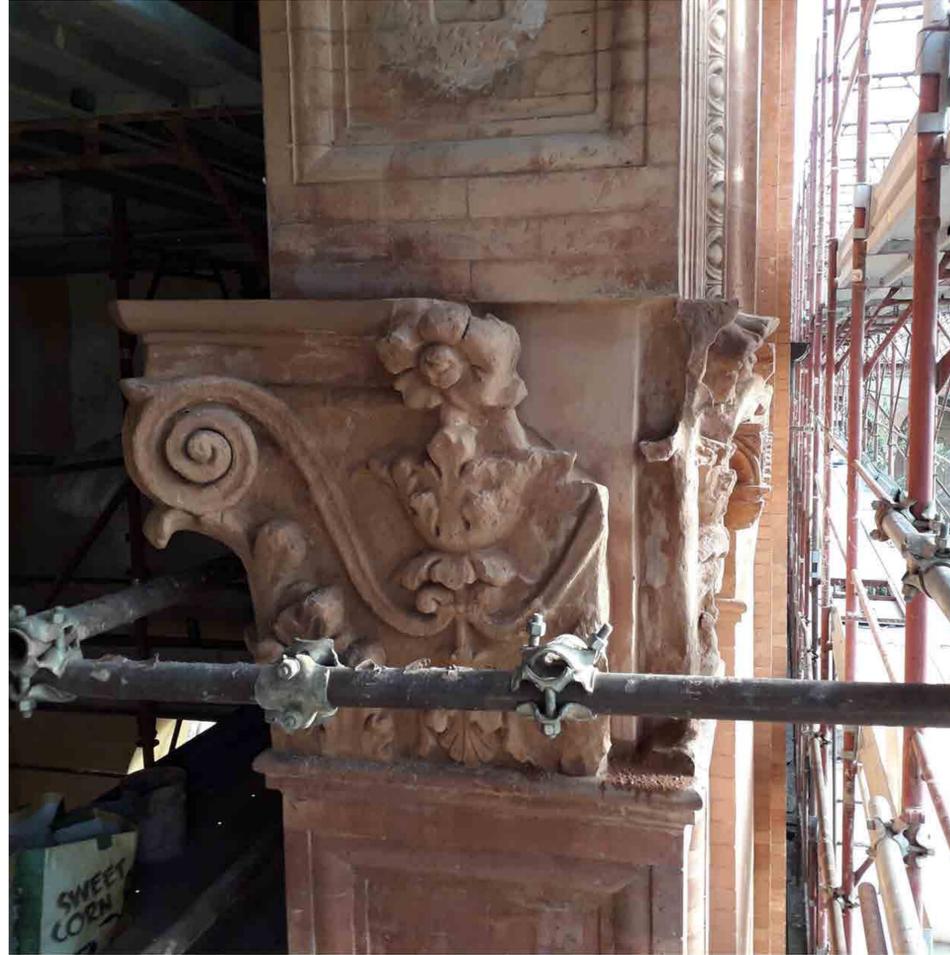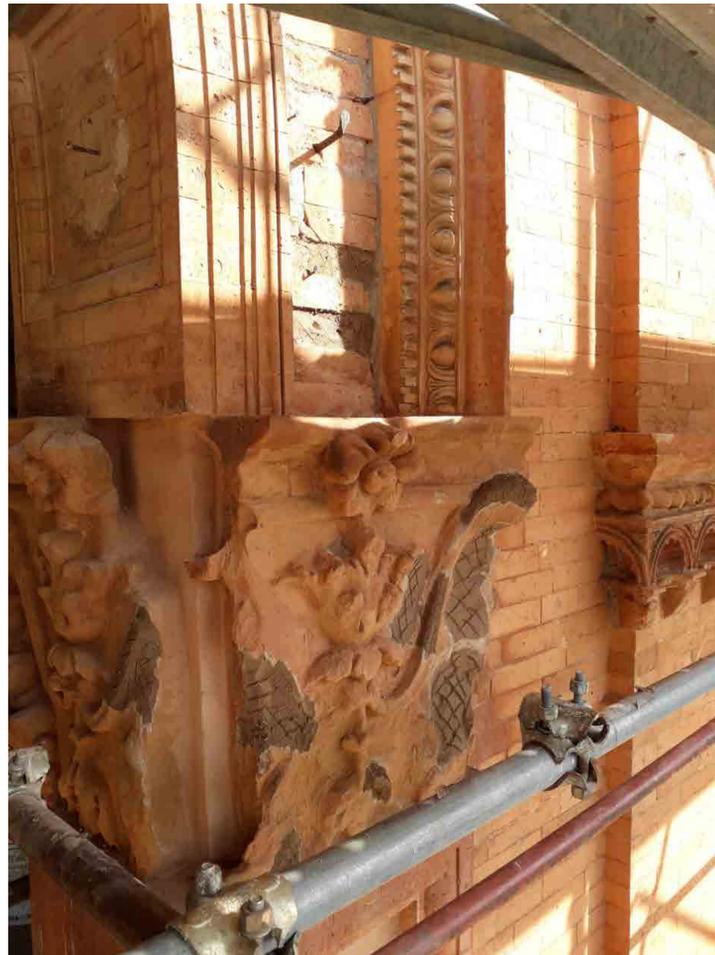

prova di pulitura del trattamento biocida dove è rileggibile l'attacco biologico presente



fase intermedia della stuccatura



vista dell'intervento completato

intervento sulle cornici dei deambulatori dove sono stati recuperate tutte le cromie originali grazie ad un intervento di pulitura selettiva

