


FASE 1

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE OPERE:

- REALIZZAZIONE DI N° 4 FONDAZIONI SPECIALI PER OGNIUNO DEI PILASTRI INTERNI, PROFONDE 20 mt. CON RELATIVI NUOVI PLINTI DI FONDAZIONE IN C.A.
- REALIZZAZIONE DI N° 4 STRUTTURE TEMPORANEE IN PROFILI METALLICI A SOSTEGNO DEI SOLAI E DELLA COPERTURA
- DEMOLIZIONE DI N° 4 COLONNE ESISTENTI ZONA INGRESSO DAL PIANO TERRA FINO AL PIANO SECONDO
- COSTRUZIONE DI N° 4 COLONNE IN ACCIAIO E C.S. ARMATO
- RIPRISTINI DEFINITIVI DELLE 4 COLONNE CON UTILIZZO DI MATTONI, SUCCESSIVO RIEMPIMENTO INTERNO IN C.S.
- RICOSTRUZIONE DEFINITIVA DEGLI ARCHI COLLEGATI ALLE COLONNE E DELLE FINTE VOLTE IN ARELLATO
- RICOSTRUZIONE DEFINITIVA DELLE PARETI PORTANTI E DI TAMPONAMENTO IN LATERIZIO AL P. T. E AL PIANO PRIMO
- FINITURA MEDIANTE INTONACATURA, TINTEGGIATURA E PULIZIA FINALE DEGLI AMBIENTI, CON RICOLLOCAMENTO DEGLI ARREDI.




DETTAGLIO STRUTTURA INTERNA PILASTRI ESISTENTI DEMOLITI PRESENTI IN ALCUNI TRATTI AL PIANO TERRA

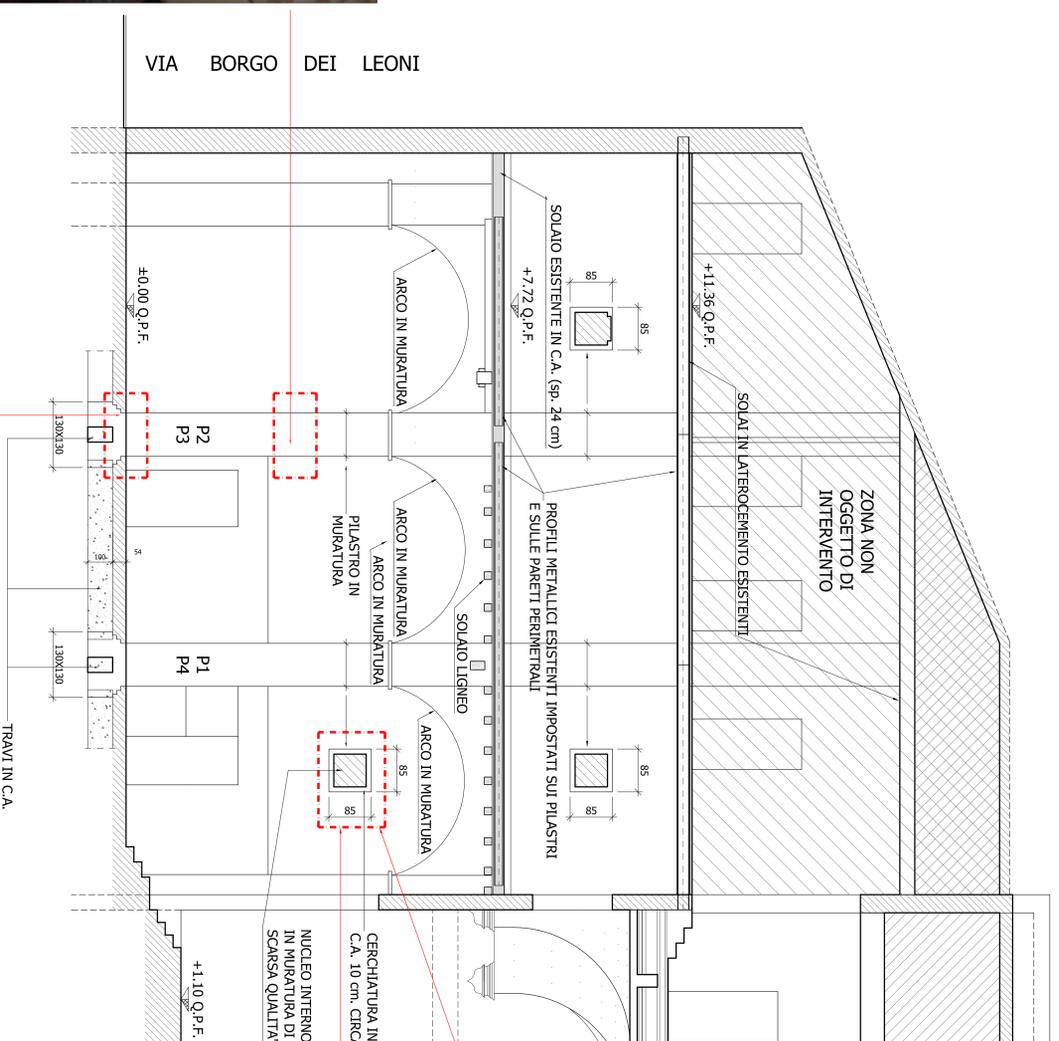


DETTAGLIO TRAVI E PLINTI DI FONDAZIONE ALLA BASE DEI PILASTRI INTERNI

STRALCIO PIANTA DI RIFERIMENTO

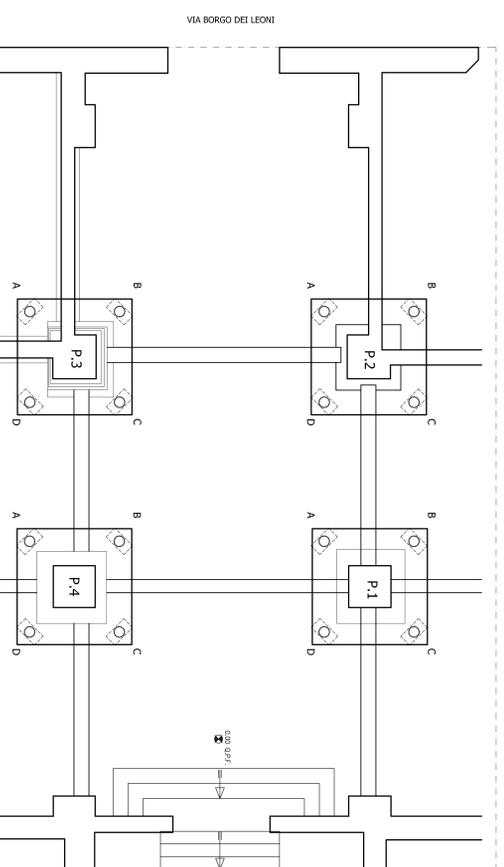

- FASE 1:**
- ESECUZIONE DI SONDAGGI PRELIMINARI FINALIZZATI ALLA VERIFICA DELLE STRUTTURE DI FONDAZIONE ESISTENTI E DEI PILASTRI INTERNI;
 - DEMOLIZIONE LOCALIZZATA A LIVELLO DELLE FINTE VOLTE IN ARELLATO AL PIANO TERRA;
 - DEMOLIZIONE LOCALIZZATA A LIVELLO DELLE PARETI DI TAMPONAMENTO E/O PORTANTI NELLE ZONE A RIDOSSO DEI PILASTRI DA DEMOLIRE.

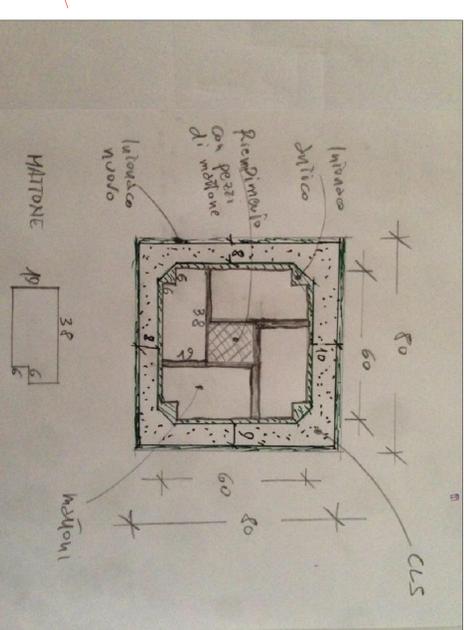

DETTAGLIO COMPOSIZIONE TIPICA PILASTRI ESISTENTI



DETTAGLIO ARMATURA RIVESTIMENTO ESTERNO IN C.S. PRESENTE SU ALCUNI PILASTRI



COMUNE DI FERRARA
ASSINCRONATO LAVORI PUBBLICI

PROGRAMMA REGIONALE DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO DEI BENI CULTURALI - EX ART. 11, L.R. 16/12/ART. 2, D.L. 74/12 INTERVENTI SUI BENI CULTURALI COMPITI DA SANSA DEL 2012

LAVORI DI RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DEI COMPLESSI SEDE DEL TRIBUNALE DI FERRARA - 1° STRALCIO - INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PORZIONE DI EDIFICIO DELL'ALA SUD (LATO INGRESSO)

Progettista:
Ing. GIULIANO MEZZADRI
Ing. MARCO BENAZZI - strutture
Ing. ELISABETTA MANCINI - sicurezza
Ing. SARA ZANELLA - sicurezza
Ing. ANH. VALENTA VIRGILI - progetto architettonico

Linee apodiarie:
R. Comune di Ferrara
Ing. FERRUCCIO LANZONI
Dir. aziendale degli interventi:
R. Comune di Ferrara
Ing. Ferruccio Lanzoni
Ditta esecutrice degli interventi:
R. Comune di Ferrara
Ing. Ferruccio Lanzoni
Rc: Miro Srl Impresa di Costruzioni (capogruppo)
Pec: Tcr_Srl (mandato)

2017-2018
